


Projet de construction d'un bâtiment d'accueil sur le site de Poul Fetan


# DOSSIER DE PRÉSENTATION







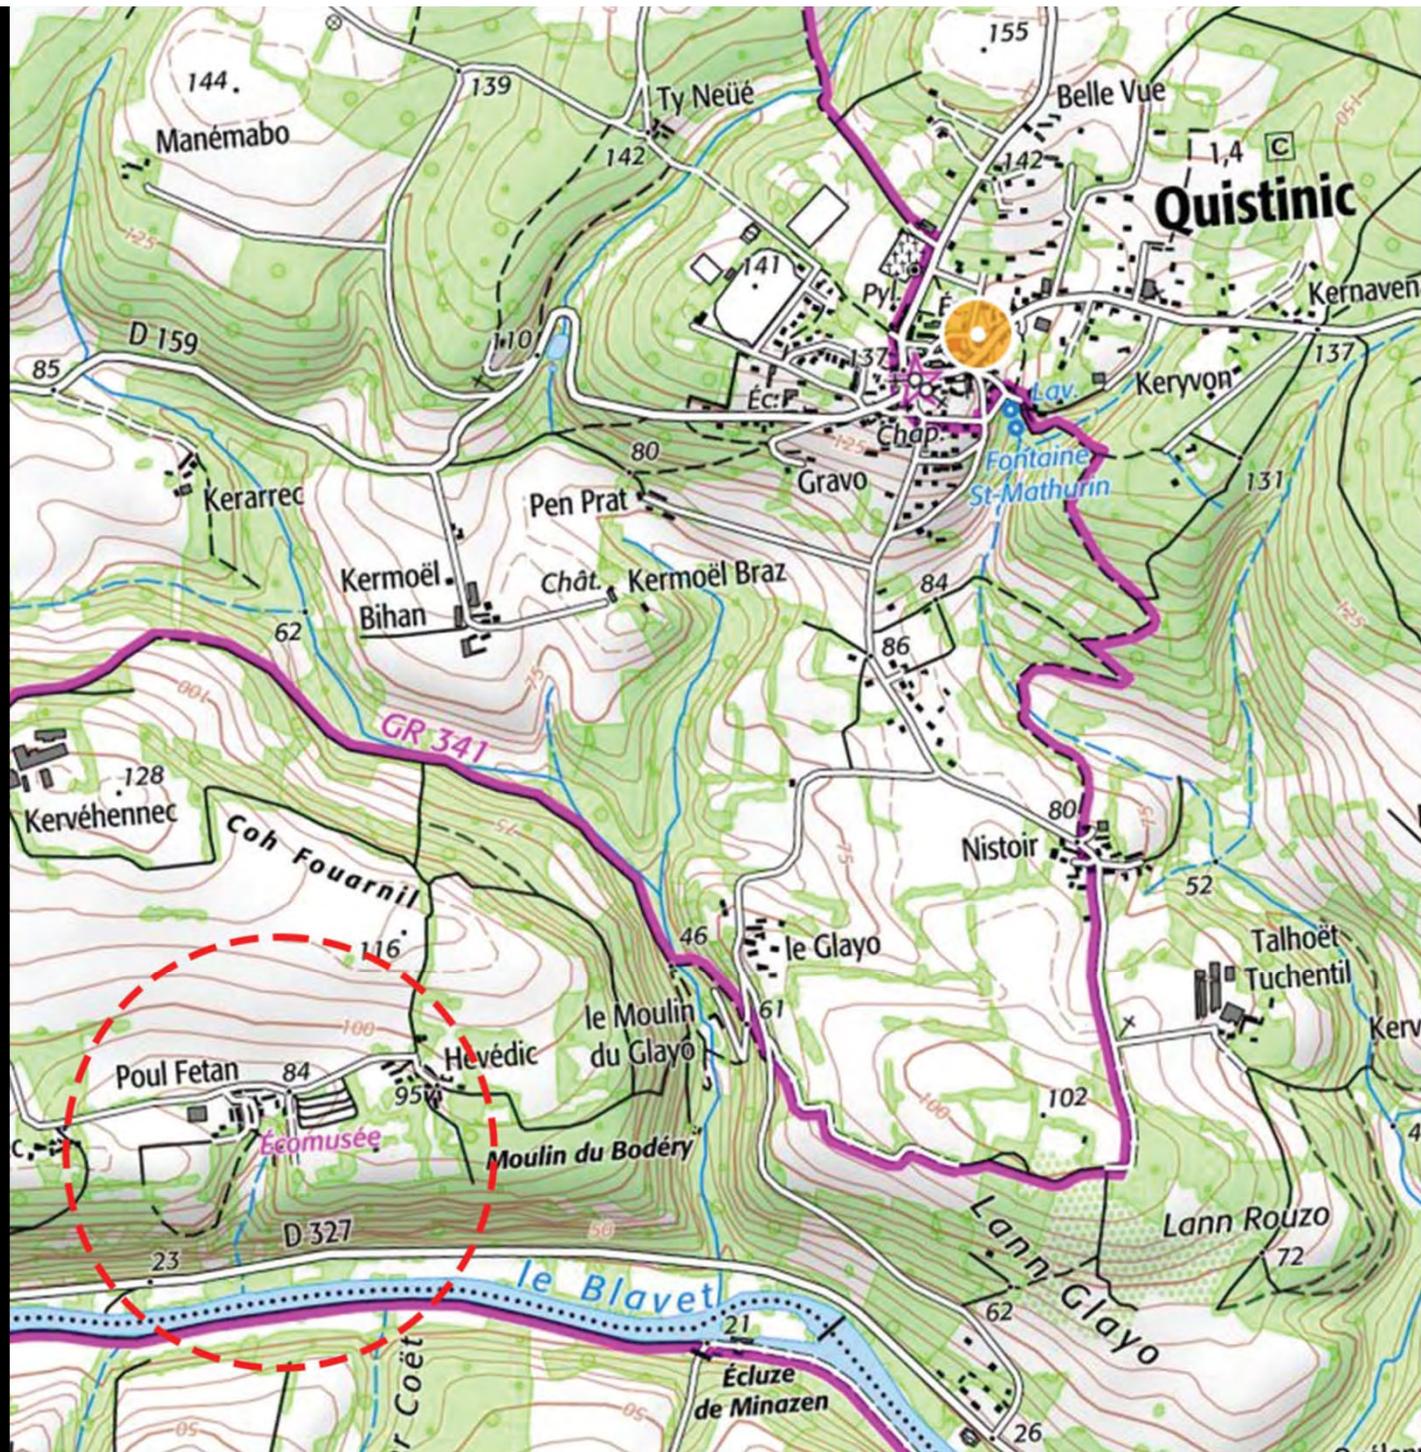



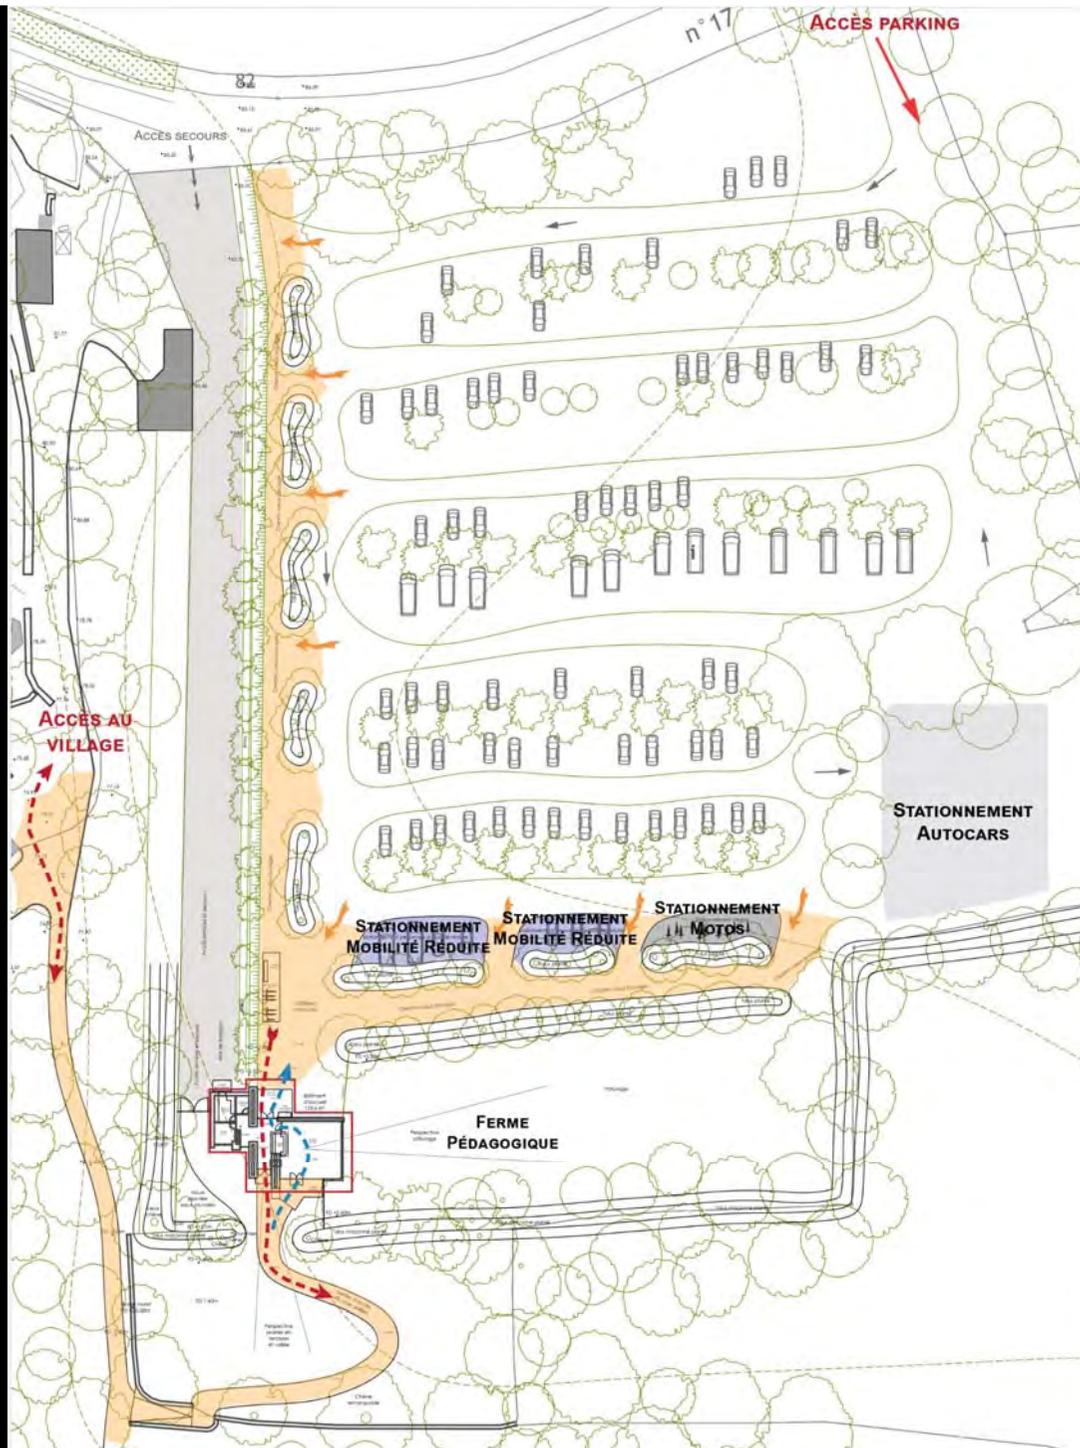

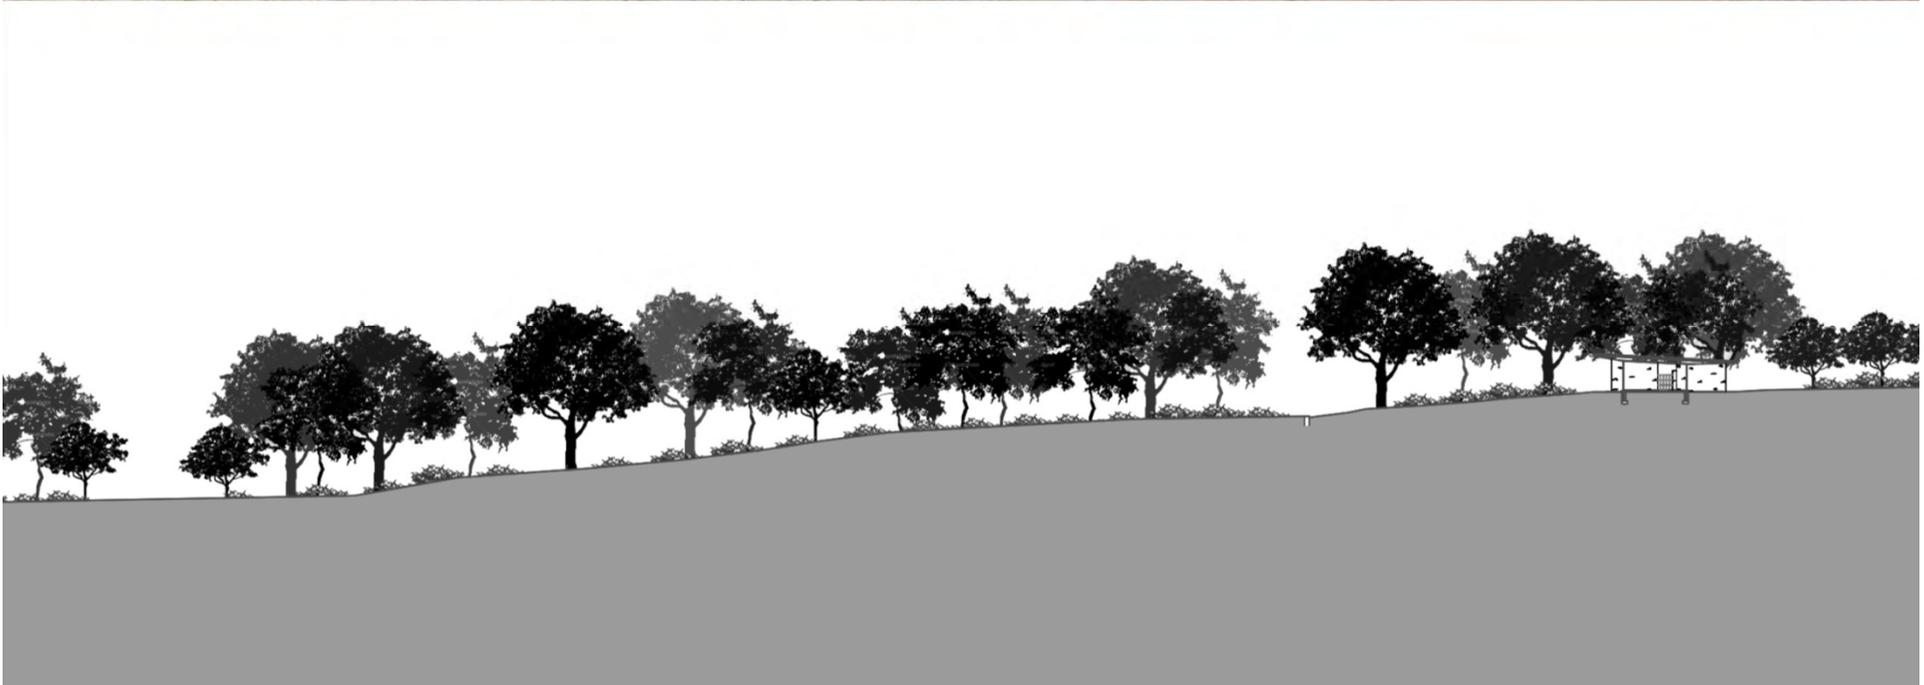


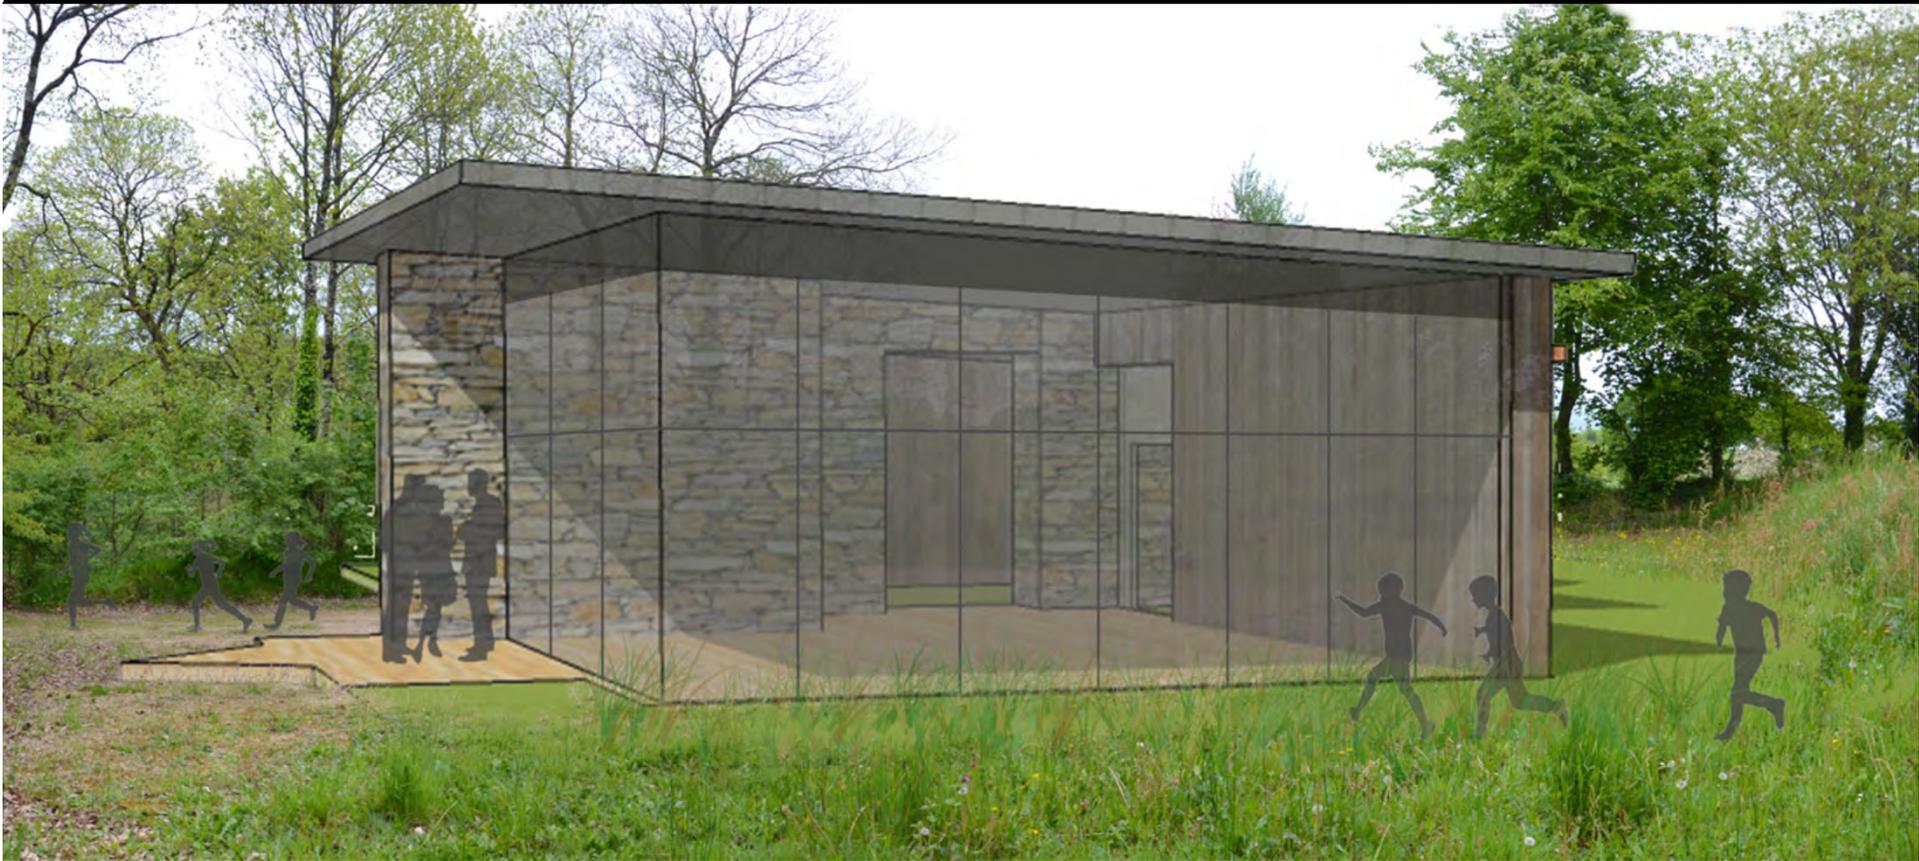








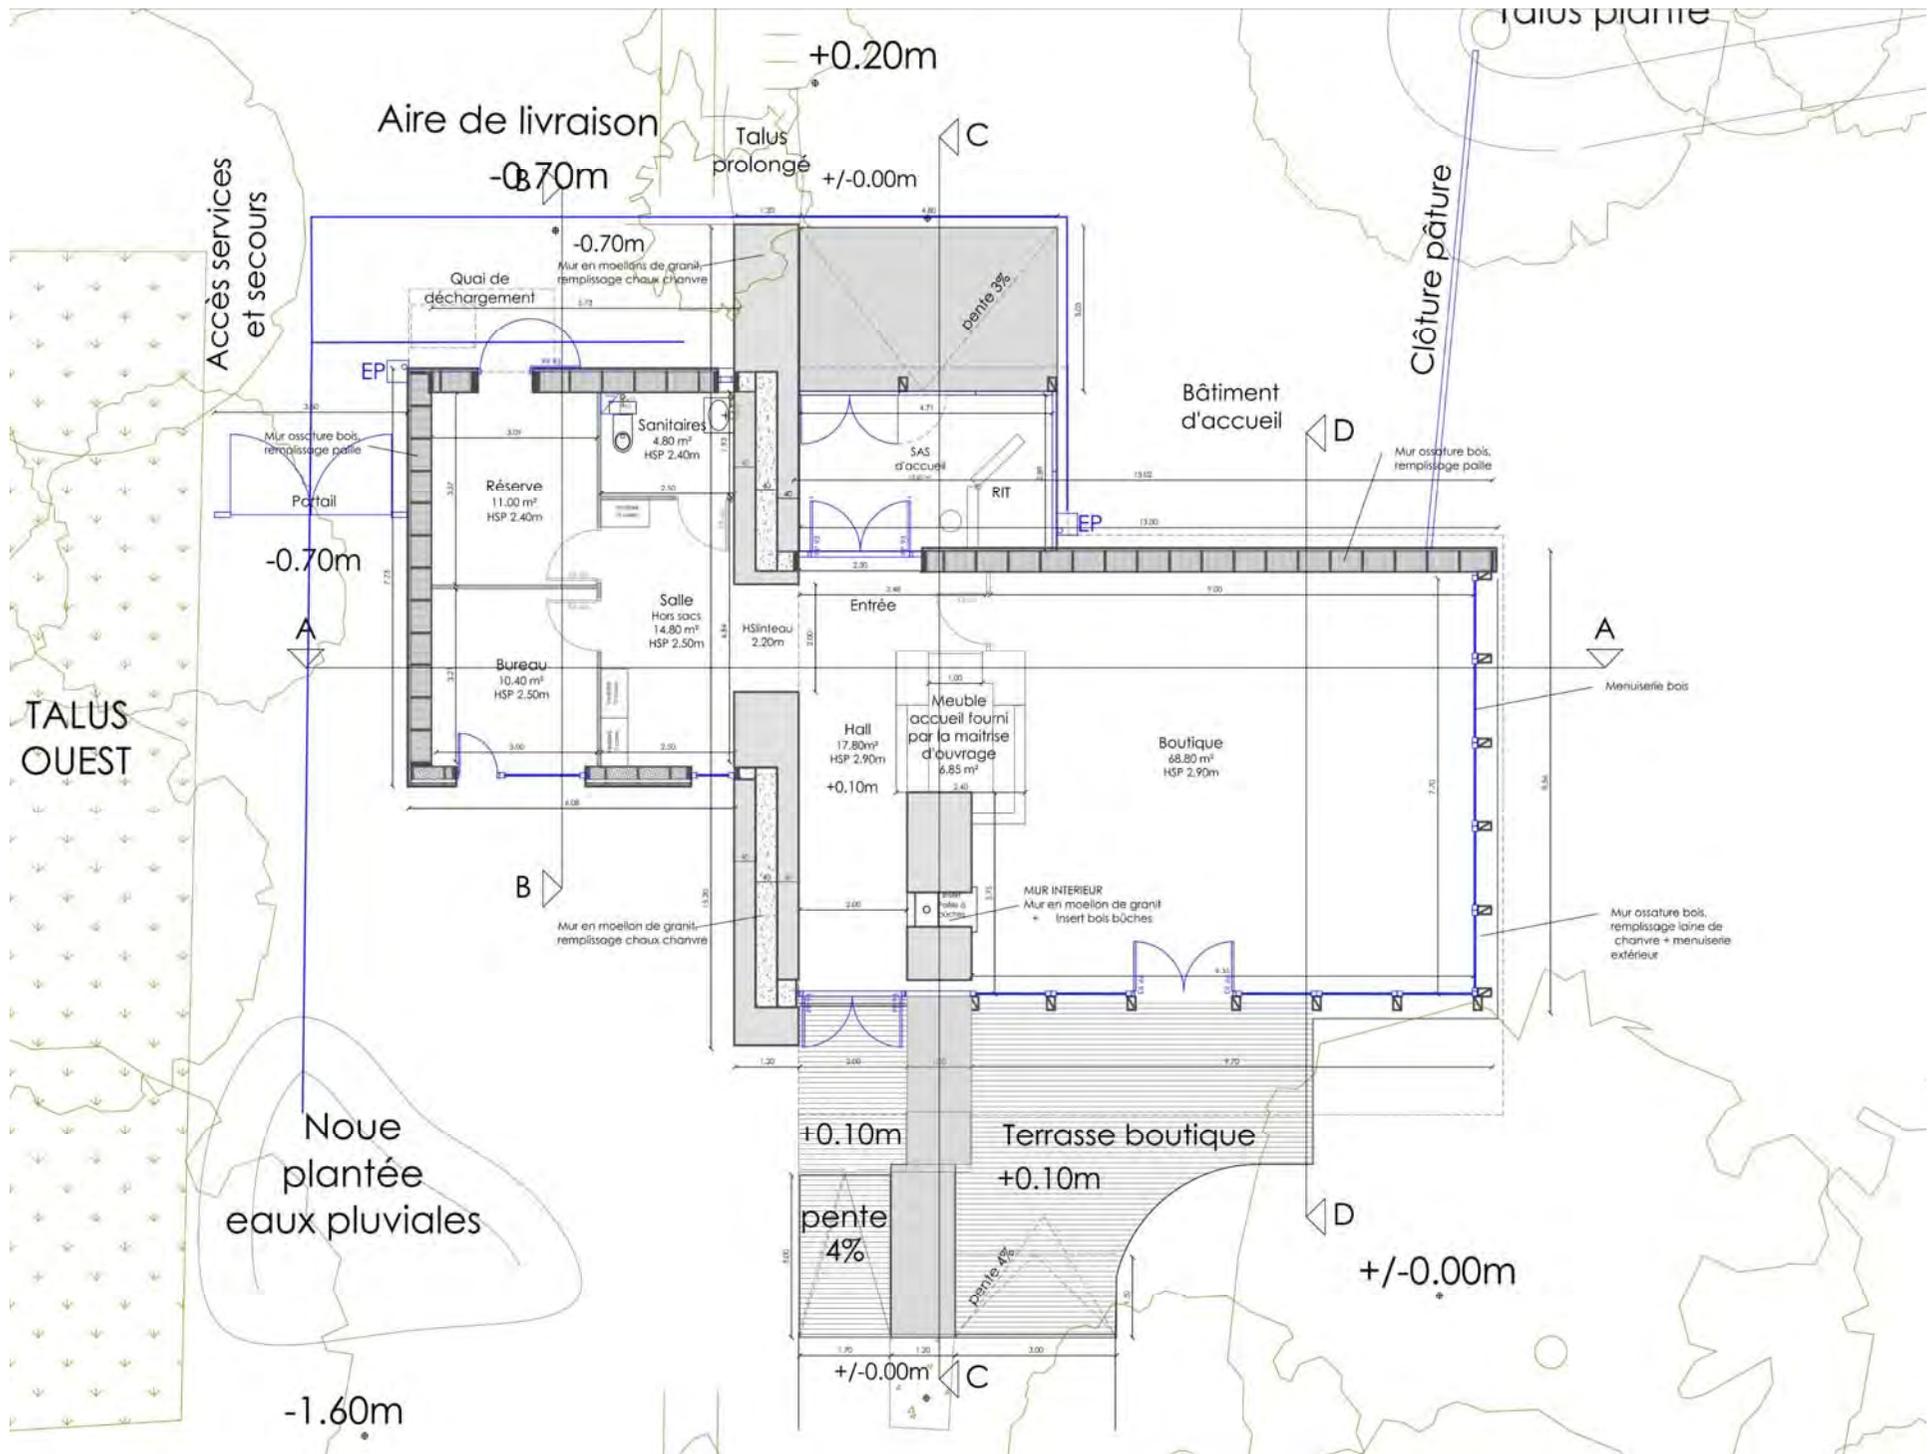

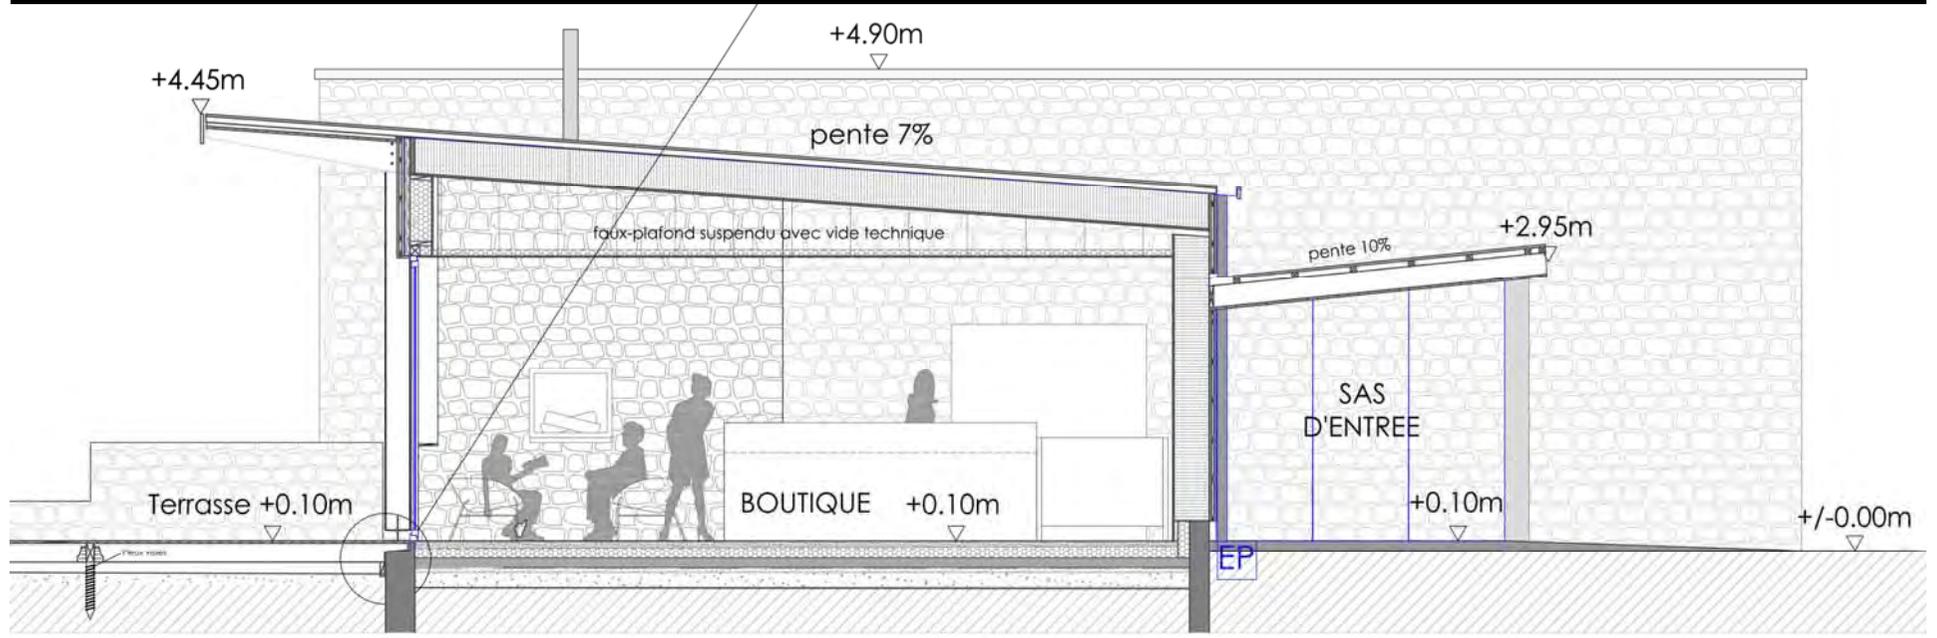



# POUL FETAN

## CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'ACCUEIL

### DCE - PLANNING PREVISIONNEL

Semaine de démarrage : 42

ACTIVITÉ	DÉBUT	DURÉE	2020												2021																																			
			octobre			novembre			décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août																	
			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<b>LOT 1 : TERRASSEMENT- VRD</b>																																																		
1 MOIS DE PREPARATION	38	4																																																
INSTALLATION DE CHANTIER	42	1																																																
TERRASSEMENT	42	1																																																
TRANCHEES	42	1																																																
RESEAUX	43	1																																																
SURFACE / VOIRIE	44	2																																																
REMBLAIEMENT / REGALAGE	48	1																																																
<b>LOT 2 : MACONNERIE</b>																																																		
FONDATION	46	2																																																
MUR EN PIERRE	4	6																																																
RESEAUX SOUS DALLAGE	1	1																																																
DALLAGES	2	1																																																
DALLE ISOLANTE	3	1																																																
APPUIS DE FENETRE / SEUILS	4	1																																																
ENDUITS / REJOINTOIEMENT	10	2																																																
<b>LOT 3 : CHARPENTE</b>																																																		
PLANS EXE	41	4																																																
PREFABRICATION	45	4																																																
POSE OSSATURE/CHARPENTE	49	2																																																
SAS ACCUEIL	50	1																																																
TERRASSE	5	2																																																
<b>LOT 4 : COUVERTURE</b>																																																		
VOLIGEAGE	1	1																																																
COUVERTURE ZINC	2	3																																																
<b>LOT 5 : MENUISERIES EXTERIEURES</b>																																																		
PLANS EXE	45	2																																																
POSE	5	3																																																
<b>LOT 6 : DOUBLAGES/CLOISONS/FAUX PLAFONDS</b>																																																		
CLOISONNEMENT DOUBLAGES	8	2																																																
FAUX PLAFONDS	10	3																																																
JOINTOIEMENT	12	2																																																
MENUISERIE INTERIEURE	9	1																																																
<b>LOT 7 : REVETEMENT DE SOL</b>																																																		
CARRELAGE	14	3																																																
<b>LOT 8 : ELECTRICITE</b>																																																		
DISTRIBUTION RESEAU	8	3																																																
ECLAIRAGES	9	4																																																
<b>LOT 9 : PLOMBERIE</b>																																																		
DISTRIBUTION RESEAU	8	2																																																
APPAREILS SANITAIRE	17	1																																																
VENTILATION	8	1																																																
<b>LOT 10 : PEINTURE</b>																																																		
PEINTURES	17	2																																																
NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE	19	1																																																
<b>LOT 11 : FUMISTERIE</b>																																																		
RESEAU RECUPERATEUR CHALEUR	8	1																																																
INSERT BOIS	9	1																																																

Fin du mois de préparation

Clos-couvert

Réception de

Séchage

Séchage

Village de Poul-Fetan

